



लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

चराङ, मुस्ताङ

आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न कार्यहरूको वार्षिक समिक्षा

कार्यालयको जनशक्तिको विवरण

विवरण	स्वीकृत दरवन्दी	पदपूर्ती				रिक्त
		स्थायी	काज	करार	जम्मा	
राजपत्राङ्कित	११	४	-	१	५	६
राजपत्रअनंकित	२१	६	-	१	७	१४
अन्य कर्मचारी	५	-	-	३	३	२
जम्मा	३७	१०		५	१५	२२



आ.व. २०८०/८१ को विभिन्न शाखा तथा केन्द्रको प्रगति विवरण

पुर्वाधार विकास शाखा

आ.व २०८०/०८१ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु

- संघीय सशर्त तर्फको आयोजना १ वटा
- प्रदेश सशर्त तर्फको आयोजना १ वटा
- प्रदेश समपुरक तर्फको आयोजना १ वटा
- आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन संख्या :
 - उपभोक्ता समिति वाट १६ वटा
 - निर्माण व्यवसायी मार्फत ३ वटा
- अघिल्लो वर्षको बहुवर्षिय ४ वटा ठेक्का आयोजनाको रकम भुक्तानी गरिएको ।
- गत आ.व. को २ वटा आयोजनाहरुको रकम भुक्तानी गरिएको ।
- घमी ढाकमर एक घर एक धारा खाने पानि आयोजना तथा लो-घेकर गुम्बा पुर्न निर्माण आयोजना सम्पन्न भएको

कार्यक्रम/आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको सारंश

ढेक्का तर्फः

योजनाको नाम	निर्माण व्यावसायी	कन्टेनजेन्सी बाहेक कबोल अंक	खर्च रकम	भौतिक प्रगति विवरण	आर्थिक प्रगति विवरण % मा
Stone Paving Work Inside Ghami Village	Tilachan Nirman Sewa	६८,१४,७७२.०१	६८,०७,३५२.३६	१००	९९.९
Construction Of Yara Khola Bridge	Tilachan Nirman Sewa	४३,८७,६३४.५४	४३,२६,६३६.६६	१००	९८.६
Upgradation Of Dhey Tangya Motorable Road	Prakash Nirman Sewa	५८,१९,९१९.६७	५६,६८,१००.६४	१००	९७.३
Construction Of Ghar Gumba Bridge	Prakash Nirman Sewa	३३,०८,४९१.४८	३२,९४,०८३.९८	१००	९९.८

परामर्स तथा डीपीआर

कर्य विवरण	परामर्शदाता	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	कार्यान्वयनको अवस्था	भौतिक प्रगति विवरण	आर्थिक प्रगति विवरण % मा
Construction Of Yara Khola Bridge	Epsilon Consulting & Developer Pvt.ltd	499601.93	490307	कार्य सम्पन्न भई सकेको	100%	98%
Construction Of Ghar Gumba Bridge	Diyalo Engineering Consulting pvt.ltd	495071.53	490996.3	कार्य सम्पन्न भई सकेको	100%	99%

उपभोक्ता समिति बाटः-

योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको नाम	कन्टेनजेन्सी बाहेक लागत अनुमान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि	खर्च रकम	भौतिक प्रगति विवरण % मा	आर्थिक प्रगति विवरण % मा
सुर्खाड तारजालि निर्माण क्रमागत	सुर्खाड तारजालि निर्माण क्रमागत उपभोक्ता समिति	२१,६७२३.२३	२०८०/०६/२३	२०८१/०३/१५	२,१६,७२३.२३	१००	१००
यारा समुदायिक भवन निर्माण (क्रमागत)	यारा समुदायिक भवन निर्माण क्रमागत उपभोक्ता समिति	८,६३,७७८.१३	२०८०-०८-०७	२०८१/०३/१५	८,५६,७३९.७६	१००%	९९.१
ढी सिचाई कुलो तथा मुहान निर्माण	ढी सिचाई कुलो तथा मुहान निर्माण उ.स	४,५०,८५४.५५	२०८०-०६-२९	२०८१/०३/१५	४४९,९६७.२३	१००%	९९.६
चराड सभाहल निर्माण	चराड सभाहल निर्माण उ.स	३७,६२,१३४.६९	२०८०-१२-२०	२०८१/०३/१५	३७,६२,१३४.६९	१००	१००
लुरी गुम्बामा सिडि तथा रेलिड निर्माण	लुरी गुम्बामा सिडि तथा रेलिड निर्माण उ.स	१६,८०,५८१.४	२०८०-१२-१०	२०८१/०३/१५	१६,८५,८८२.५३	१००	१००
घमि नाली निर्माण	घमि नाली निर्माण उ.स	२०,३१,५११.०१	२०८१-०१-२०	२०८१/०३/१५	२०,३१,५११.०१	१००	१००
घारा खेत पर्खाल तथा तारजालि निर्माण	घारा खेत पर्खाल तथा तारजालि निर्माण उ.स	७,५१,३७१.७९	२०८०-१२-१०	२०८१/०३/१५	७,५१,३७१.७९	१००	१००
ढाकमर खेत पर्खाल तथा गेट निर्माण	ढाकमर खेत पर्खाल तथा गेट निर्माण उ.स	२१,६४,६४७.९२	२०८०-०६-१४	२०८१/०३/१५	२१,६४,६४७.९२	१००	१००

चुडसी गुफा तथा कोठा निर्माण योजना	चुडसी गुफा तथा कोठा निर्माण उ.स	१६,११,६५७।०६	२०८०-०१-२०	२०८१/०३/१५	१६,११,६५७।०६	१००	१००
बाल विकास केन्द्रको गेट तथा पर्खाल निर्माण	बाल विकास केन्द्रको गेट तथा पर्खाल निर्माण उ.स	३,२२,४७८।९६	२०८१-०२-०२	२०८१/०३/१५	३,२२,४७८।९६	१००	१००
घिलिङ स्कुल गेट तथा पर्खाल निर्माण	घिलिङ स्कुल गेट तथा पर्खाल निर्माण उ.स	५,३८,३१३.९३	२०८०-०१-२०	२०८१/०३/१५	५,३८,३१३.९३	१००	१००
घिलिङ गुम्बामा बाटो निर्माण	घिलिङ गुम्बामा बाटो निर्माण उ.स	७,५५,५५०.४२	२०८१-१-२०	२०८१/०३/१५	७,५५,५५०.४२	१००	१००
मराङ युङगा कुलो निर्माण	मराङ युङगा कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१८,५२,५११.५६	२०८०-१२-०९	२०८१/०३/१५	१८,५२,५११.५६	१००	१००
घिलिङ छुवा तारजाली तथा खेत पर्खाल मर्मत	घिलिङ छुवा तारजाली तथा खेत पर्खाल मर्मत उ.स	१,६३,२४८.०८	२०८१-०१-२०	२०८१/०३/१५	१,६३,२४८.०८	१००	१००
घिलिङ खेत भित्रको कृषि सडक निर्माण	घिलिङ खेत भित्रको कृषि सडक निर्माण उ.स	१६,१३,१३०.६३	२०८१-०१-२०	२०८१/०३/१५	१६,१३,१३०.६३	१००	१००
ध्ये थाङजुङ समाज घर निर्माण क्रमागत	ध्ये थाङजुङ समाज घर निर्माण क्रमागत उ.स	८,५६,२९३.९७	२०८०-०८-२८	२०८१/०३/१५	८,५४,०५०.७२	१००	९९.७

गत आ.व. को निम्न योजना हरुको दायित्व भुक्तानि गरिएको

क्र.सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको नाम	कन्टेनजेन्सी बाहेक लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति विवरण	आर्थिक प्रगति विवरण % मा
१.	चराङ खेतपर्खाल निर्माण क्रमागत	चराङ खेतपर्खाल निर्माण क्रमागत उ.स	३७८८२९६. ४०	३७३४५००	१००%	९९.६
२.	सुर्खाङ गुम्बामा फर्निचर खरिद	सुर्खाङ गुम्बामा फर्निचर खरिद उ.स	२९७५००. ३७	२९७५००. ३७	१००	१००

वर्षको बहुवर्षिय ठेक्का आयोजनाको रकम भुक्तानी गरिएको

क्र.स	निर्माण कार्यको नाम	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	यो वर्ष सम्मको खर्च	भौतिक प्रगति	आर्थिक प्रगति विवरण
१	५ सैया हस्पिटल	साफे/सन्त जे.भि	१२/२८/२०७९	२,७९,८३,२३८.७२	४५%	३२%
२	लो-घेकर गुम्बा पुर्न:निर्माण	ओम/बुद्ध सन्त जे.भी	२०७८/३/१४	३,५९,७८,०४५.२९	१००%	७८%
३	घमी ढाकमार एक घर एक खाने पानि आयोजना	ईच्छाकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स	१२/११/२०७९	१,२४,३७,४९८.२०	१००%	८४%
४	घिलिङ स्कुल छात्रावास निर्माण	ईमोर्टल कोमल कन्सट्रक्सन जे.भी	२०७७/४/३	३,११,९६,४३७.३३	८०%	७१%

कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना सम्बन्धी विवरण:-

क्र.स	निर्माण कार्यको नाम	बिनियोजित रकम
१	सामुदायिक च्यांग्रा स्रोत विकास	८०,००,०००

समस्या तथा चुनौतिहरू

- अनुगमनको पाटो प्रभावकारी बनाउन खोज्दा खोज्दै पनि भौगोलिक कठिनाईले गर्दा सोचे अनुरूप नभएको ।
- समग्रमा पर्वाधारको क्षेत्रमा सन्तोषजनक नै कार्यहरू भएता पनि भौगोलिक कठिनाई तथा चिसो मौसम को कारण योजना हरु समयमै गरिन नसक्नु र थोरै समयमा धेरै योजना हरु समापन गर्नु पर्ने भएकोले प्रभावकारि रूपमा योजना हरु समापन गर्न असहज भएको ।
- केहि योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई सहभागीतामुलक गराउन नसकेको अवस्थालाई स्वीकार्दै आगामि दिनमा यसको पनि सुधार गरि सबैलाई विकासको क्रियाकलाप र अन्य कामकाजमा उनीहरू लाई अपनत्व र जिम्मेवारी बोध गराउनु जनताको मुख्य मुख्य आवश्यकताको योजनाहरू संचालनमा ल्याउन पर्दछ ।
- बहुबर्षिय ठेक्का घिलिङ स्कुल छात्रबास निर्माण योजनाहरूको मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध नभएकोले कार्य सम्पन्न अनुसार भुक्तानि दिन नसकेको कारणले समयमा कार्य सम्पन्न नभएर पटक पटक म्याद थप्नु परेको,
- बहुबर्षिय ठेक्का ५शैया हस्पिटलमा रनिङ बिल अनुसार मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध नगराइएको ले कार्यन्वयनमा ढिला सुस्ति भएको ।

केही तस्विरहरु



यारा खोला पुल निर्माण कार्यान्वयनको अवस्था



यारा खोला पुल निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात



लुरी गुम्वा सिडि तथा रेलिड निर्माण कार्यान्वयनको अवस्था



लुरी गुम्वा सिडि तथा रेलिड निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात



आयोजनाको नाम: घमी ढाकमर एक घर एक धारा खाने पानी आयोजना



आयोजनाको नाम: घर गुम्बा पुल निर्माण



आयोजनाको नाम: ढाकमर खेतपर्खाल निर्माण क्रमागत

आ.व २०८१/८२ को योजना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)	खरिद विधि
१	घमि गाउँभित्र छपनी ढुङ्गा विछ्याउने	१,४०,००	ई-विदिड
२	ताडग्या सिचाई कुलो निर्माण योजना	४०,००	ई-विदिड
३	चराङ सभाहल निर्माण क्रमागत	७०,००	ई-विदिड
४	चराङ खेतपर्खाल निर्माण योजना	१,००,००	ई-विदिड
५	घार गुम्बा छपनी ढुङ्गा विछ्याउने कार्य	२६,००	ई-विदिड
६	घिलिङ खेत भित्रको कृषि सडक निर्माण क्रमागत	२०,००	ई-विदिड
७	चुङ्सी गुम्बा जाने मोटरबाटो निर्माण	१५,००	कोटेशन
८	घमी सिचाई कुलो मर्मत	५,००	उ.स
९	ढि सिचाई कुलो निर्माण	१०,००	उ.स
१०	यारा काप्कु सिचाई कुलो मर्मत	१२,००	उ.स
११	घारा सिचाई कुलो निर्माण क्रमागत	४,००	उ.स

१२	मराङ खानेपानि निर्माण आयोजना	२,००	उ.स
१३	मराङ खेतपर्खाल तथा तारजाली निर्माण	२३,००	ई-विदिङ
१४	चराङ गुम्बा संरक्षण	१९,००	उ.स
१५	ध्ये थाङ्जुङ समाज घर रङ रोगन	१५,००	उ.स
१६	ताङ्ग्या स्याउबारी ग्यावियन निर्माण	१५,००	उ.स
१७	गाँउपालिका भवन पर्खाल तथा अन्य निर्माण	१५,००	कोटेशन
१८	लुरी गुम्बा मर्मत तथा शौचालय निर्माण	७,००	उ.स
१९	घमी सामुदायिक स्याउबारी स्तरतोन्नती	२०,००	उ.स
२०	घिलिङ गुम्बामा बाटो निर्माण क्रमागत	१०,००	उ.स
२१	घमी पुरानो गुम्बा मर्मत सम्भार	१०,००	उ.स
२२	घारा आ.वि तारजाली तथा गेट निर्माण	६,००	उ.स
२३	ढाकमर खेत पर्खाल तथा तारजाली निर्माण	७,००	उ.स
२४	घिलिङ युवा क्लबको स्टेज निर्माण	१५,००	उ.स
२५	ढाकमर गुम्बा मर्मत सम्भार	२,००	उ.स
२६	जियो पार्क स्तररोन्ती	१८,००	उ.स

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरू

वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (स्थानीय तह)

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	वार्षिक भौतिक बजेट	बार्षिक लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति	बार्षिक वित्तीय लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षककालागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरूसमेत)	१०००००००	१६	१६	१०००००००	९२२६१५७
२	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२८२००००	१३	१३	२८२००००	२०२३४९८
३	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	१६४०००				१३१२८३
४	विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	८७१०००	८	८	८७१०००	६७६०००
५	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमसमेत)	२२०६०००	४	४	२२०६०००	११८२०००

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	वार्षिक भौतिक बजेट	बार्षिक लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति	बार्षिक वित्तीय लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति
६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	७१३०००	२२६	२२६	७१३०००	५०८५००
७	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथागैरआवासीय)	२०९६०००	१२८	१२८	९८३०००	९६२२००
८	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	६०८०००	१	१	०	०
९	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	४८०००	७३	७३	४८०००	४००००
१०	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता	१०००००	०	०	०	०
११	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको सम्पूरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाउं निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	४०००००	०	०	०	०
१२	शैक्षणिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुरिवेक्षण	५९३०००	१०	९	५९३०००	१३३६९५

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	वार्षिक भौतिक बजेट	बार्षिक लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति	बार्षिक वित्तीय लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति
१३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन	८१०००	२४४	२४४	८१०००	३९८५०
१४	आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक तलब भत्ता	११८४४००	२		११८४४००	९९०४६४
१५	शिक्षकहरुलाई इमिस तलिम	२०००००	१०	१०	२०००००	१५७५००
१६	बाल वचत	६०००००	३११	९७	६०००००	२३२८००

कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा गरेका राम्रा कार्यहरु:-

- १ शिक्षक अभावका कारण शिक्षण सिकाईमा असर परका श्री जनज्योति र श्री घमी आधारभूत विद्यालयमा आन्तरिक
- २ स्रोतबाट (विज्ञान, गणित) निजी शिक्षक नियुक्ति
- ३ कार्यक्रम सञ्चालनमा देखा परेका समस्या:-
- ४ न्यून विद्यार्थी संख्याका कारण राष्ट्रपति रनिडशिल प्रतियोगिता सम्पन्न हुन नसकेको
- ५ भौगोलिक विकटता कारण विद्यालय अनुगमनमा कठिनाई

स्वास्थ्य शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरू

Digitalization Activities

• Family Health profile:

➤ Yes

• Digitalization (eHMIS):

➤ Yes

• Pregnancy tracking:

➤ Yes

- Best practices and feedback on Digitalization
- Accurate data of the total population
- Accuarate number of people out of the contry for foreign employment
- helps in the identification of specially needs people and whether they do have the card (अपङ्ग पारिचय पत्र कार्ड)
- better known to the family structure of individuals (joints or single family)
- for the better results on family healh profile the ward head and other political individuals involvement is more encouraged

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- खोपको खेरदर घटाउन खोप माग गर्न अगाडि बच्चाको नाम लिष्ट तयार गरि सो अनसार खोप माग गर्ने गरिएको
- पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपन गरिएको

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- vaccine prevalent disease surveillance system सुधार गर्न
- खोपको कभरेज बढाउन स्व.से. मार्फत जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने

पोषण कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- पोषण सुधारको लागि OTC centre स्थापना गरिएको
- ५ वर्षमनिका बालबिकाको height, weight, MUAC मापन गरिएको
- राष्ट्रिय भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइएको

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- खाना र पोषण सम्बन्धि misconception, taboos and harmful social cultural practice न्युनिकरण गर्दै जाने

IMNCI कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- ५ वर्षमनिका सबै बालबालिकहरूको IMNCI निर्देशिका बमोजिम classification, treatment, recording, reporting व्यवस्थित रूपले गरिएको

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- BCC (behavioral change communication) माफत personal hygiene and sanitation लाई सुधार गर्ने

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

प्रोटोकल अनुसार ANC जाँच गर्ने गर्भवतिहरूको संख्या बढाउन सामुदाय स्तरमा जनचेतना फैलाउनका साथै पोषण सुधारका लागि प्रोत्साहने भत्ता दिइएको complicated delivery case refer को लागि नि-शुल्क ambulance सेवा

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- Institutional delivery बढाउन जोड दिने
- management and improvement of delivery room (including new delivery sets, boots, gown etc)

परिवार नियोजन कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- Defaulter tracing गरेको
- Counselling for unwanted pregnancy

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- गणस्तरिय परिवार नियोजन सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोग कार्यक्रम सम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्ती (फोकल पर्सन) को व्यवस्था गरेको ।
- औषधीको नियमित आपूर्ती गरिएको ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- प्रयोगशाला सेवाको लागि पालिकालाई माग गरिसकेको र यस आ.व. भित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना
- active case finding गर्न Screening camp गर्ने
- समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम गर्ने

पालिकाबाट गरिएका नविनतम् क्रियाकलपहरू

- Free ambulance service
- Laptop for each health facility
- Budget allocation for Emergency medicine
- USG machine
- Laboratory service (vacancy announcement)

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरू

- भौगोलिक विकटता
- Weather challenge
- Net problem
- Lack of manpower ANM and SBA trained


कृषि विकास शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरु

कार्यक्रमको नाम:

- ग्रिन हाउस निर्माणको लागी प्लाष्टिक खरिद कार्यक्रम ।
- विउविजन खरिद कार्यक्रम ।
- स्याउ पकेट निरन्तरता (आ.व. २०७९/०८० स्थापना भएको पकेट) कार्यक्रम ।

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च
१	ग्रिन हाउस निमाणको लागी प्लाष्टिक खरिद कार्यक्रम	२,००,०००	१,९५,०००
२	विउविजन खरिद कार्यक्रम	३,००,०००	३,००,०००
३	स्याउ पकेट निरन्तरता कार्यक्रम (आ.व. २०७९/०८० स्थापना भएको पकेट)	६,००,०००	०

तस्विरः

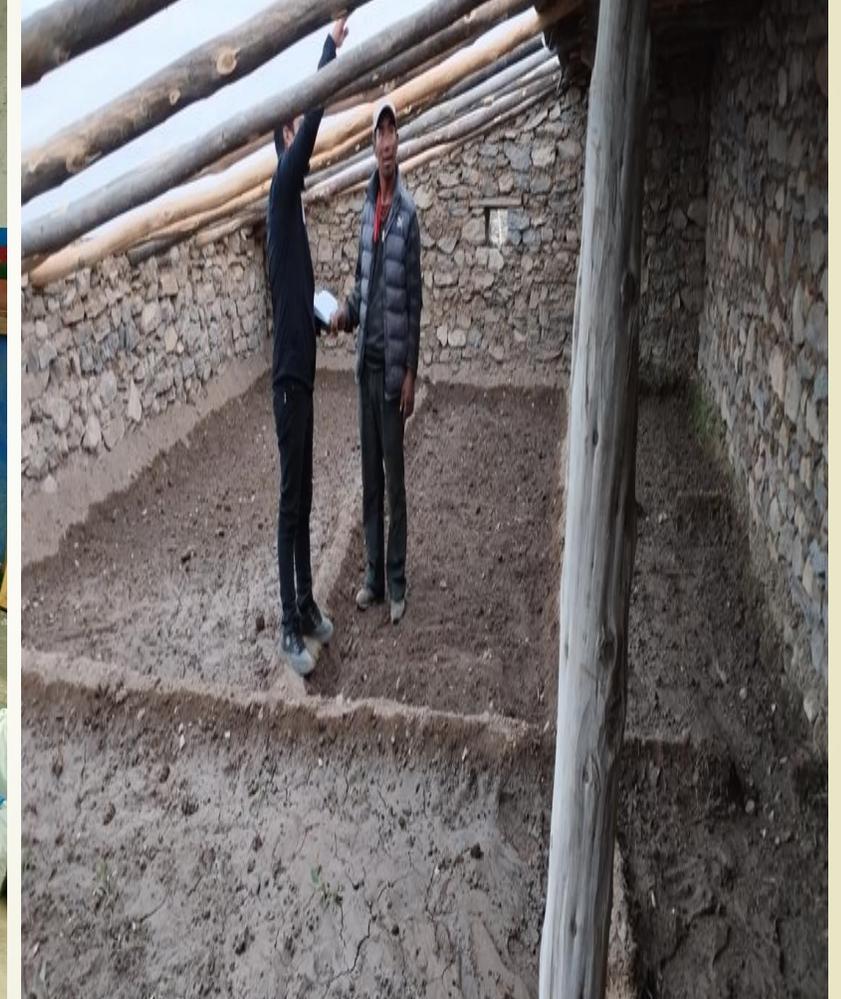

आ.व. २०८१/०८२ मा कृषि विकास शाखाबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरू:

- विउविजन खरिद कार्यक्रम ५००,०००
- घुम्टी स्थलगत कृषक तालिम ३००,०००
- विषादि खरिद कार्यक्रम ३००,०००
- आकस्मिक रोग किरा नियन्त्रण कार्यक्रम १००,०००
- क्रप कटिङ्ग कार्यक्रम २००,०००
- सबै वडामा कृषक समुह गठन अभियान कार्यक्रम १००,०००
- अनुगमन तथा फिल्ड भिजिट कार्यक्रम ५०,०००
- कृषि यान्त्रीकरण ५० प्रतिशत अनुदान १०००,०००
- किसान सुचिकरण कार्यक्रम १००,०००
- आ.व. २०८१/०८२ मा नयाँ स्याउ तथा ओखर पकेट विकास कार्यक्रम १२,००,०००
- कृषि तथा पशुपन्छी तथ्याङ्क अध्यावधीक कार्यक्रम १००,०००

पशु सेवा शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरू

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	प्राप्त
१	पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यक्रम	३००,०००	२९६,०००	गाउँपालिका
२	महामारी तथा आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१००,०००	१००,०००	संघीय सशर्त
३	भेटेरीनरी औषधी तथा सामग्री खरिद कार्यक्रम	३००,०००	२९६,०००	गाउँपालिका
४	सामुदायीक च्याङ्गा स्रोत विकास कार्यक्रम	८०००,०००	०	संघीय सशर्त सम्पुरक अनुदान

समस्या तथा चुनौतीहरू -

- १) शिविर कार्यक्रम संचालन गर्दा गाउँपालिकाको केन्द्र देखि टाढाको दुरिमा रहेका स्थानहरूहरूमा भौगोलिक बिकटताका कारण प्राविधिकहरूलाई जान आउन समस्या भएको ।
- २) प्रशस्त मात्रामा गाउँपालिकामा सवारी साधनको अभावका कारण भाडामा सवारी साधन लिईएको र सवारी साधनको भाडादर एकदमै बढि भएको ।



आ.व. २०८१/०८२ मा पशु सेवा शाखाबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु:

क्रस	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	प्राप्त
१	याक प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००,०००	संघीय सशर्त
२	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१२,०००	संघीय सशर्त
३	चरण खर्क सुधार कार्यक्रम	६००,०००	संघीय सशर्त
४	च्याङ्गा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००,०००	संघीय सशर्त
५	पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यक्रम	४००,०००	गाउँपालिका
६	व्यवसायीक पशुपालन कृषकहरुका लागि स्थलगत तालिम संचालन कार्यक्रम	२००,०००	गाउँपालिका
७	पशु शाखा औषधी तथा भिटामिन खरिद कार्यक्रम	३००,०००	गाउँपालिका
८	बाह्य परजिवि नियन्त्रणका लागि डिपिड ट्याङ्क निर्माण कार्यक्रम	५००,०००	गाउँपालिका

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित
कार्यहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जम्मा विवरणः

प्रथम त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
२७१५७७६	२८२५१३६	२८२११९६	२८०३२११	१,११,६५,३१९

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विवरण

वडा नं.	जन्म			मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारि से	जम्मा	
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या		जम्मा
१	७	६		१३	२	३		५	४	१७	३	११				७९
२	१०	३		१३	६	३		९	२	१४			१	३		५४
३	२	४		६	२	०		२	३	९						३१
४	२	१		३	२	३		५	१	१०			२	७		३५
५	२	१		३	२	०		२	१	२			१	४		२२
जम्मा	२३	१५	०	३८	१४	९	०	२३	१३	५२	३	११	४	१४	०	२२१

उपलब्धीहरुः

- ▶ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली अफलाईनबाट अनलाईन प्रणालीमा भई व्यक्तिगत खातामा रकम भुक्तानी गरिएको
- ▶ वडा कार्यालयका पायक पर्ने स्थानमा नै गई लाभग्राहीहरुको वर्षेनी नवीकरण गरिएको
- ▶ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अफलाईनबाट अनलाईन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको
- ▶ वडा कार्यालयका पायक पर्ने स्थानमा नै गई लाभग्राहीहरुको सहजताका लागि योग्य उमेर पुगेका नया दर्ता फाराम सकलन
- ▶ वडाका घर-घरमै गई बैंकसँगको सहकार्यमा लाभग्राहीहरुमा हात-हातमा भत्ता वितरण
- ▶ सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी विस्तारै जनचासो बढ्नु

समस्या एवं चुनौतिहरुः

- मुख्यत आवतजावत गर्नमा कठिनाई
- आवश्यक स्रोतसाधनमा समस्या हुनु
- वडा कार्यालयमा बिजुली पावरमा कमि हुनु
- प्रणालीमा नेटवर्कको कहिलेकाही समस्या हुनु

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरु

वित्तीय प्रगति विवरण

विनियोजित बजेट		कुल बजेट रु.	कुल चालु खर्च रु.	कुल कामको लागि पारिश्रमिक खर्च रु.	कुल चालु खर्च%	कुल कामको लागि पारिश्रमिक खर्च%
चालु (पुजीगत चालु समेत) रु.	कामका लागि पारिश्रमिक					
२१,५२,०००/-	३३,४८,०००/-	५५,००,०००/-	११,५६,३९२/-	२८,८७,१६४ /-	५३.७%	८६.२ %

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	श्रमिक संख्या	जम्मा कार्य दिन	विनियोजित बजेट	खुद गरेको कार्य	भुक्तानी रकम
१	चराड लघु जलविद्युत जाने बाटो मर्मत	१, चराड	८	७६१	६,०४,८००	५,७४,३३६	५,७५,३१६
२	मराड साक्री सिचाई कुलो मर्मत	१, मराड	५	४४०	३,४५,०००	३,३१,५३८	३,३२,६४०
३	मदारिकमा देखि ढाक्मर गोरेटो बाटो मर्मत	२, ढाक्मर	५	४३०	३,७८,०००	३,२७,७०५	३,२५,०८०
४	घमी नली निर्माण (मर्मत)	२, घमी	५	४७४	३,७८,०००	३,५९,१२६	३,५८,३४४
५	घिलिङ सिचाई कुलो तथा पोखरी मर्मत	३, घिलिङ	६	४९६	४,५३,६००	३,७४,८५२	३,७१,२४६
६	सुर्खाङ गोरेटो बाटो मर्मत	४, सुर्खाङ,	८	६६८	६,०४,८००	५,०५,६८१	५,०५,००८
७	ध्ये ताङ्ग्या तरिला गोरेटो बाटो मर्मत	५, ध्ये, ताङ्ग्या	७	५४७	५,२९,२००	४,१३,३०६	४,१३,५३२
	जम्मा		४४	३८१६	३२,९३,४००	२८,८६,५४४	२८,८७,१६४

रोजगारी अवस्था

- आन्तरिक रोजगारी सृजनामा सहयोग
- शैक्षिक बेरोजगार
- दीर्घकालीन रोजगारी अभाव
- नीतिगत चुनौती
- निर्माण सामग्री अभाव

प्रयास

- साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन
- कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम संचालन भएको
- प्रभावकारी आयोजना छनोटमा जोड
- स्थानियलाई रोजगारी तथा आर्थिक लाभ को सुनिश्चत

चुनौती तथा सामाधन

चुनौती

- नीतिगत समस्या
- आयोजना कार्यान्वयन
- रोजगारी र आर्थिक लाभ
- प्राविधिक तथा सामाजिक मुल्यांकन

उपाय तथा न्युनतम आधार

- नीतिगत सुधार
- आयोजना कार्यान्वयनमा साझेदारी
- आन्तरिकरण
- सीप तथा रोजगारी
- रोजगार रणनीति तर्जुमा

तस्बीरहरु



लघु उद्यम विकास शाखा: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरू

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजित बजेट रकम रु.	खर्च	खर्च %	मौज्दात
प्राविधिक सीप विकास तालिम	३,३१,२००	३,३१,२००	१००%	०
३ वटा वडामा प्रविधि हस्तांतरण	१,३८,०००	१,३८,०००	१००%	०
उद्यमीको एडभान्स सीप विकास तालिम	१,४०,०००	१,४०,०००	१००%	०
बजारीकरणमा सहयोग	२७,६००	०	०	२७,६००
वित्तीय सेवामा पहुच	२७,६००	०	०	२७,६००
उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालक	२७,६००	०	०	२७,६००
उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	३,०३,६००	३,०३,६००	१००%	०
उद्यमशिलता विकास तालिम (आफ्नो व्यावसाय सुरुवात तथा सुधार)	६४,४००	६४,४००	०	०
समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	२,४०,०००	०	०	२,४०,०००
कुल रकममा	१३,००,००	९,१२,८००	७०%	३,२२,८००

सञ्चालित कार्यक्रमहरु २०८०/८१

कार्यक्रम	कार्यक्रम सञ्चालन स्थान	लाभान्वित सङ्ख्या	खर्च विवरण
गलैचा बुनाई	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गा,पा ५ ध्ये	११ जना	१९०९३३

कार्यक्रम	कार्यक्रम सञ्चालन स्थान	लाभान्वित सङ्ख्या	खर्च विवरण
गलैचा बुनाई	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गा ,पा २ ढाक्मार	९ जना	१९०९३३

कार्यक्रम	कार्यक्रम सञ्चालन स्थान	लाभान्वित सङ्ख्या	खर्च विवरण
गलैचा बुनाई	लो-घेकरदामोदरकुण्ड गा,पा ४ यारा	१० जना	१९०९३३

चुनौती तथा सामाधन

चुनौती

- शैक्षिक बेरोजगार
- स्थानीय सामाग्रीहरुको उपयोगमा कमी
- समयमा नै सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन नसकिनु
- बजारीकरणको अभाव

उपाय तथा न्युनतम आधार

- स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता
- सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था
- स्थानीय स्तरमा बजारीकरण गर्ने

तस्बीरहरु



वडा कार्यालय: आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्य प्रगतिहरू

क्र.सं.	विवरण	निवेदन संख्या	सिफारिस संख्या
१	नागरिकता सिफारिस	५२	५२
२	घर बाटो प्रमाणित	१२	१२
३	नाता प्रमाणित	१२१	१२१
४	अन्य	१४२८	१४२८
	जम्मा	१६१३	१६१३

पञ्जीकरण तर्फे

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	जन्मदर्ता	३८
२	मृत्युदर्ता	२७
३	बसाईसराई दर्ता	५
४	विवाह दर्ता	६५
५	सम्बन्धविच्छेद दर्ता	११
जम्मा		१४६

राजश्व संकलन

क्र.सं.	वडा नं.	संकलित राजश्व रकम
१	१	३,७८,६१०
२	२	२,५६,३५९.६
३	३	१,८३,७९०
४	४	१,४०,९१७.५
५	५	१,१७,१८०
जम्मा राजश्व रकम		१०,७६,८५७.१



“धन्यवाद”
